



ROMA
CAPITALE

Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR di Roma Capitale

Raffaele Barbato - Direttore

Indice dei contenuti

- Il PNRR a Roma – Visione d'insieme
- La Programmazione integrata – Next Generation Rome
- La governance del PNRR di Roma Capitale
- Lo stato di attuazione
- Le principali criticità
- Considerazioni generali

I numeri del PNRR per Roma Capitale

Roma Capitale è Soggetto Attuatore ad oggi di finanziamenti a valere sul PNRR pari a circa **1,15 miliardi di euro** per un totale di **279** progetti finanziati



I progetti PNRR che impattano su Roma Capitale

Alcuni **progetti PNRR attuati da soggetti diversi da Roma Capitale** avranno un impatto significativo sul futuro di Roma Capitale. Tra questi:



La Programmazione integrata: il processo di definizione

Roma Capitale ha **adottato tre linee direttrici per orientare e coordinare strategicamente** l'impiego di finanziamenti nazionali ed europei volti a promuovere l'innovazione e lo sviluppo socio-economico della città.

1

Documentazione Strategica

Attuazione delle previsioni del **Documento unico di programmazione (DUP)** al fine di allineare le linee programmatiche con gli obiettivi strategici, operativi e gestionali di Roma Capitale.

In **collaborazione sinergica con la Città Metropolitana**, è stata attivata un'azione finalizzata all'elaborazione del **Piano Strategico Metropolitano**, con l'obiettivo di coordinare congiuntamente gli interventi e le fonti di finanziamento.

2

Campagna di ascolto

Interlocuzioni con i Dipartimenti tematici per intercettare i fabbisogni progettuali, la loro congruità e maturità rispetto alle possibilità di finanziamento.

I **bisogni individuati sono stati allineati con scrupolosità agli obiettivi strategici di policy**, nonché alle fonti finanziarie disponibili ed accessibili, tra cui primeggia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)."

3

Mappatura delle opportunità di finanziamento

PNRR

Roma Capitale ha intrapreso un'attività di scouting e monitoraggio degli avvisi pubblicati a cui i Comuni potevano partecipare come Soggetti attuatori. A valere sul PNRR al momento sono stati concessi **1.14 miliardi di euro**

PN METRO / PR FESR Lazio

Il **PN Metro 21-27** apporterà circa **150M euro** per interventi sinergici con Investimenti PNRR. Il **PR FESR Lazio** garantirà ulteriori **90M euro** per due interventi di rigenerazione ad Ostia e Pietralata

DL AIUTI

DL Aiuti (dl 50/2022): destina a Roma Capitale ulteriori **258 mln € che complementano** e rafforzano gli interventi del PNRR.

FONDI DIRETTI CE

Analisi del fabbisogno di progetti sperimentali e acquisizione di **know how attraverso Programmi quali Horizon, Life**, Innovative Actions, URBACT, Interreg



La Programmazione integrata: l'applicazione operativa

Roma Capitale – attraverso la programmazione integrata di tutti i finanziamenti europei – ha costruito un **framework attuativo complementare agli obiettivi del PNRR**.

Pianificazione integrata significa **mettere a sistema le ulteriori risorse europee** per:

1. **potenziare gli investimenti** del PNRR;
2. **colmare i gap tematici e territoriali** lasciati dal PNRR

Potenziamento


- **Servizi digitali finanziati** dal PN Metro Plus a complemento dei progetti di migrazione al cloud finanziati dal PNRR
- Potenziamento degli interventi PUI (PNRR) attraverso il **finanziamento di attività immateriali** (incubatori start up e innovazione sociale) con fondi PN Metro Plus
- **Efficientamento energetico scuole** attraverso fondi CIS e PN Metro Plus a complemento degli interventi (pochi) finanziati dal PNRR
- Completamento investimento Technopole con fondi FESR Regione Lazio

Colmare i GAP

- Ulteriori progetti di rigenerazione urbana (**Ostia e Pietralata**) finanziati con risorse FESR Regione Lazio
- **Progetti di inclusione sociale** per beneficiari non compresi in progetti PNRR (donne vittime di violenza, Rom, Giovani neo-maggiorenni)
- Progetti di **gestione rifiuti** ed economia circolare non finanziati dal PNRR



La Governance del PNRR di Roma Capitale

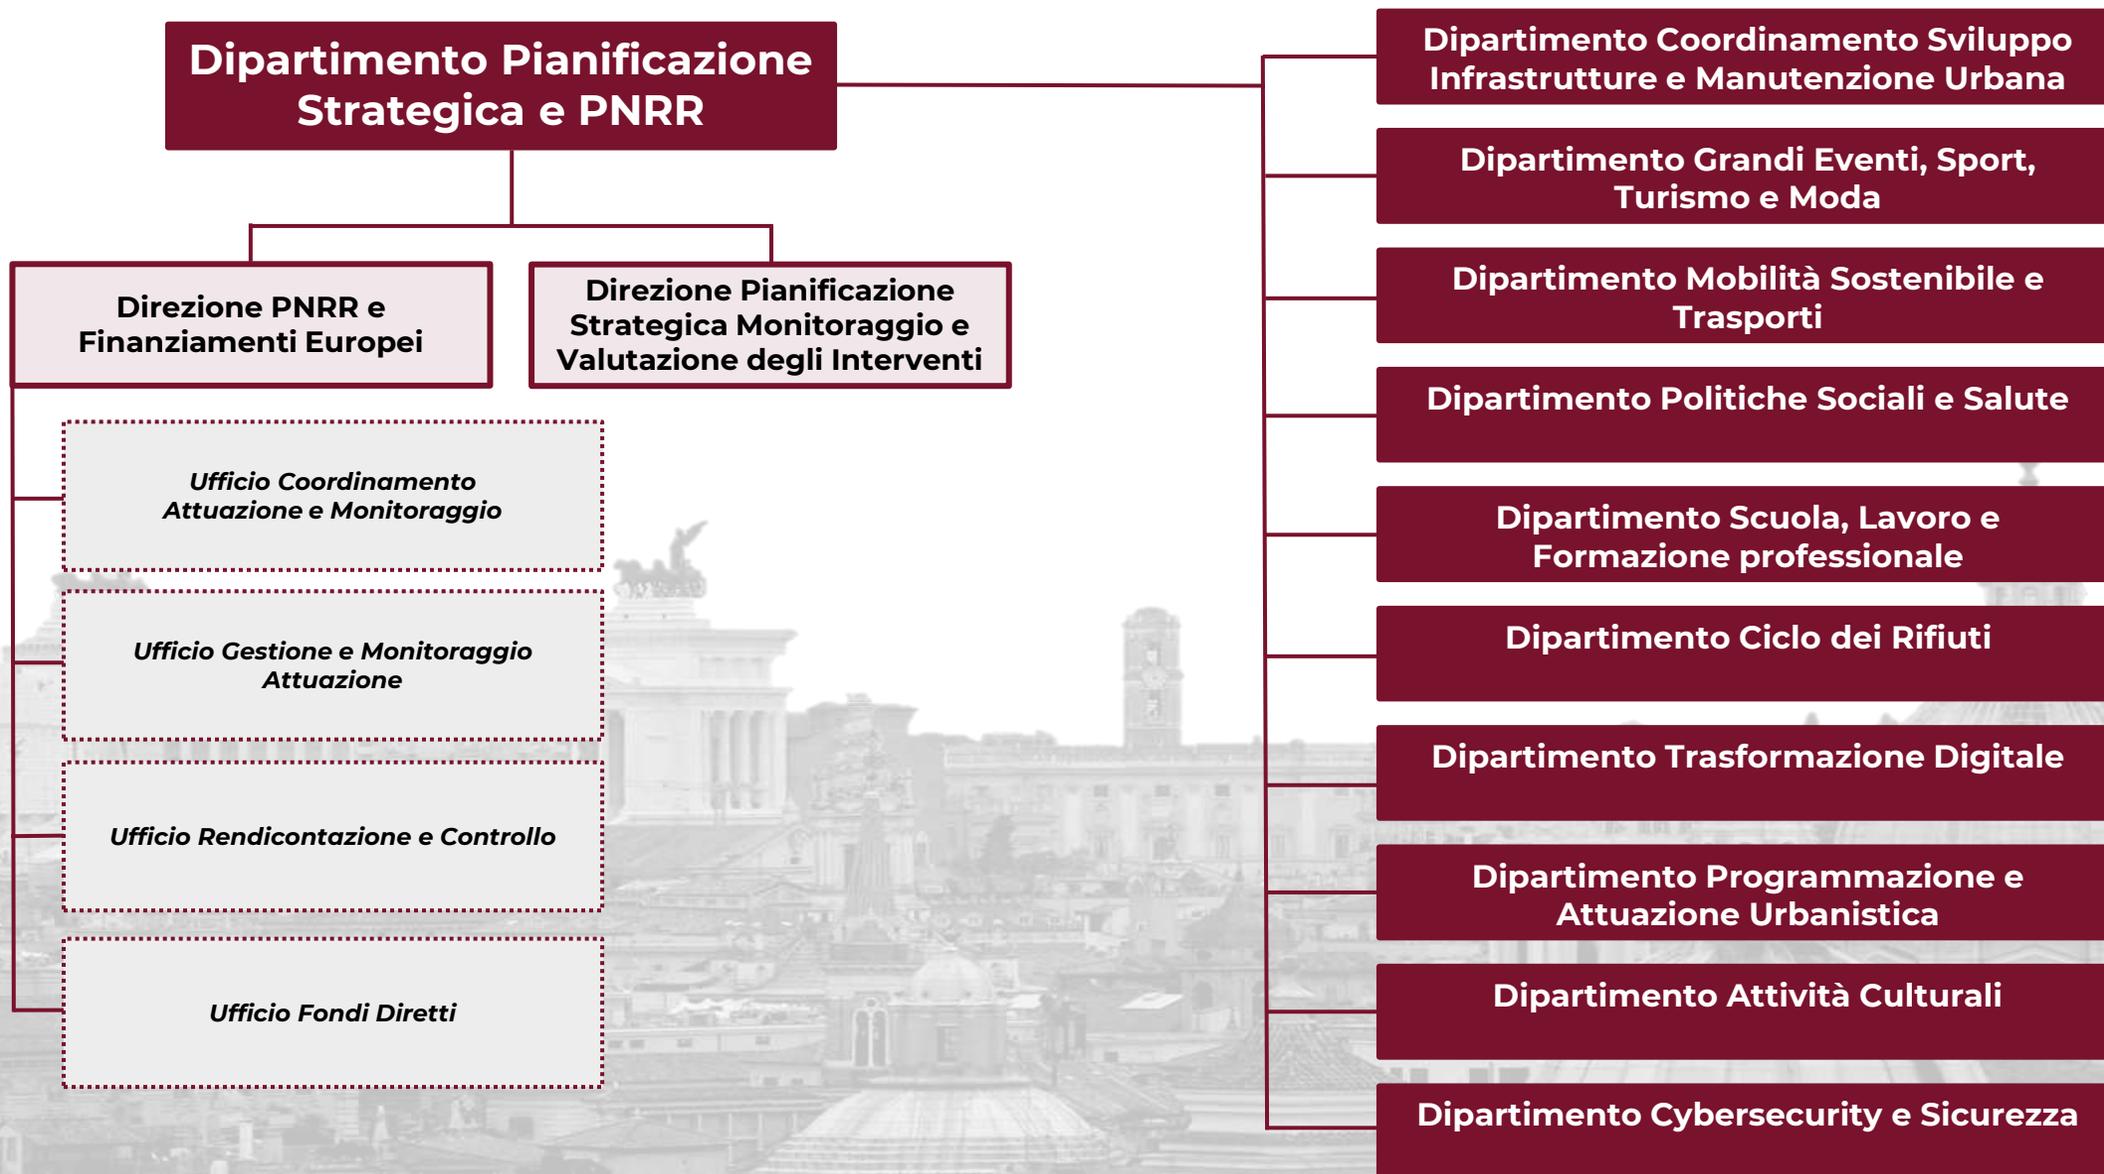

Principali attività Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR

- Accompagnamento delle strutture tecniche alla partecipazione ai diversi bandi PNRR
- Interlocuzione centralizzata con Ministeri titolari linee di investimento
- Supporto alla sottoscrizione Atti d'obbligo
- Supporto alla definizione di Atti Convenzionali con società in house e/o soggetti esterni
- Supporto alla predisposizione documenti relativi al rispetto del principio DNSH
- Elaborazione documenti di gare allineati con principi specifici PNRR
- Centralizzazione utenze REGIS
- Acquisizione gestionale interno
- Auto-controllo documentazione per monitoraggio e rendicontazione



Stato attuazione generale - 1

- Tutti gli **Atti d'Obbligo** ed **Atti Convenzionali** con soggetti esterni sottoscritti
- Stanziamenti, accertamenti ed impegni in linea con i **cronoprogrammi finanziari**, tutti gli **anticipi** sono stati richiesti
- Adesione tempestiva al **Fondo Opere Indifferibili**
- Conclusione fase di **progettazione iniziale** e della maggior parte delle conferenze dei servizi preliminari
- Le principali **aggiudicazioni di appalti integrati concluse** riguardano:
 - Piani Urbani Integrati (3 progetti, 11 CUP)
 - PINQUA (3)
 - Asili nido e scuole d'infanzia (11)
 - Progetti di Sport ed inclusione sociale (Parco Colli d'Oro, largo Chiaro Davanzati e Pala Fijlkam)
 - Efficientamento energetico di 10 cinema e teatri
 - Interventi di rigenerazione urbana presso Villa Ada
 - Complesso ERP di Via Satta

Stato attuazione generale - 2

- **Prossime aggiudicazioni** entro 31/12/2023
 - Caput Mundi (95 interventi)
 - Prima tratta Tramvia Termini-Venezia
 - Migrazione al Cloud attraverso procedura congiunta con Città Metropolitana
 - Acquisto di autobus elettrici green da parte di ATAC
- **Conferenze decisorie** ed approvazione **progettazione esecutiva** prevista a fine 2023
- Primi **cantieri** aperti:
 - Villa Ada
 - Efficientamento energetico cinema e teatri
 - Residenze per disabili
- Prime **attività immateriali** in corso di svolgimento
 - Sperimentazione MaaS for Italy
 - eventi Caput Mundi,
 - PUI: attività di co-programmazione, Arene estive, Territori a disoccupazione zero, Scuole Aperte

Principali criticità

- **L'aumento dei prezzi** delle materie (compreso tra 15% ed il 30%), non sempre coperto dal Fondo Opere Indifferibili
- La **concomitanza** dell'avvio delle **procedure di aggiudicazione** per tipologia di interventi e su scala nazionale (materie prime, concorrenza tra enti)
- **Pareri vincolanti** ed in alcuni casi negativi emersi durante le prime conferenze di servizi relativamente a vincoli paesaggistici e di rilevanza storico-culturale
- Le modifiche alla **governance nazionale del PNRR** hanno reso più difficili le interlocuzioni con Unità di Missione ministeriali. Ritardi nella pubblicazione dei Sistemi di Gestione e Controllo
- Le difficoltà di **reperimento di personale tecnico ed amministrativo** ed i limiti per l'assistenza tecnica

Considerazioni generali

- Ulteriore riconoscimento importanza delle città nei processi di transizione energetica e digitale
- Assenza di un'Agenda Urbana Nazionale
- Approccio bandi (PNRR) Vs approccio pianificazione (PN Metro Plus, DL Aiuti, etc)
- Eccessiva frammentazione bandi PNRR e non-neutralità
- Eccessiva compressione tempi di attuazione
